


I/11 - ČASTOLOVICE - oprava - rozdělení stavby do etap

termín : 14.5.2018 - 2.9.2018


x - překopy silnice

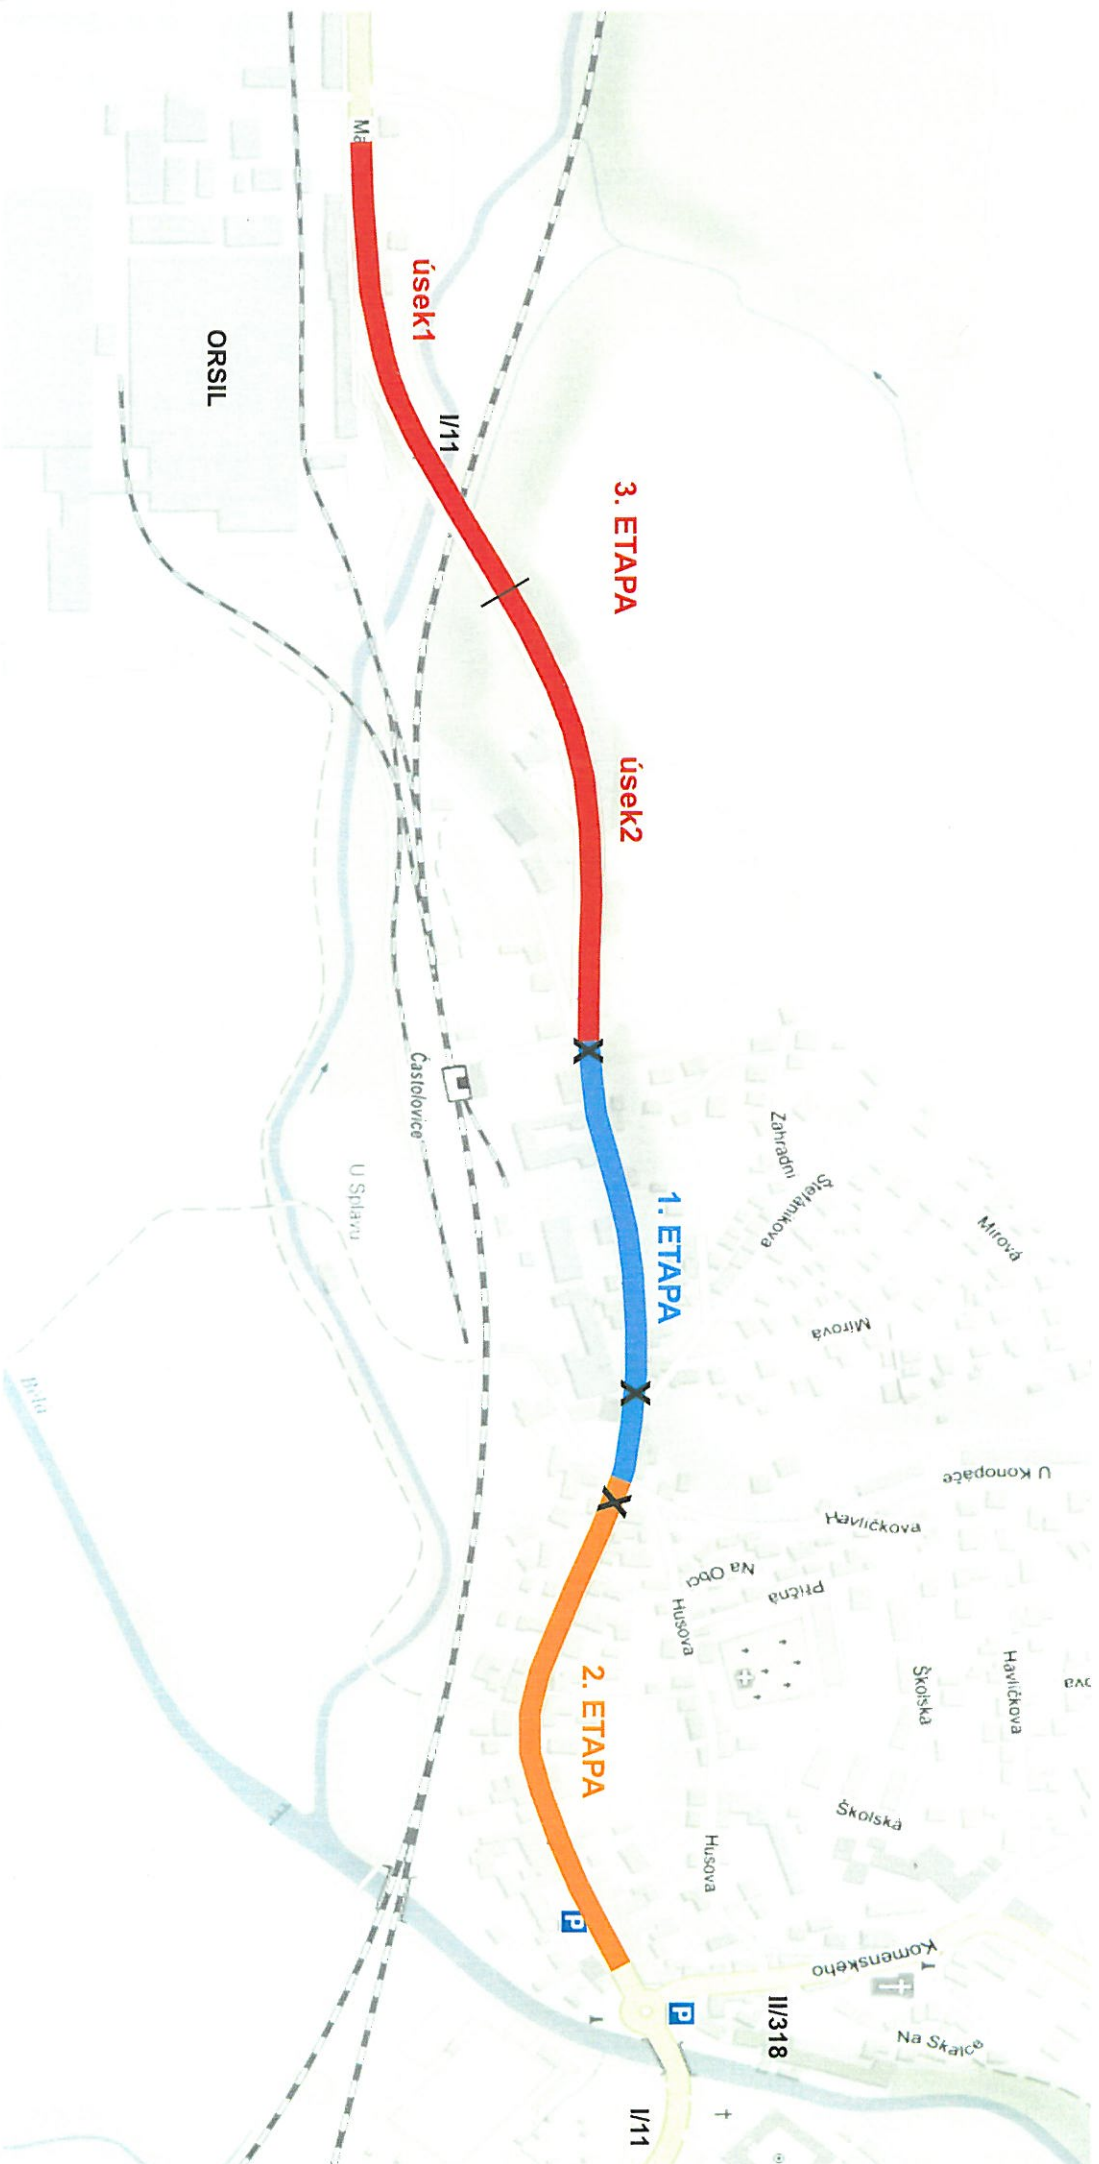


I/11 - Častolovice - oprava silnice - dle jednotlivých úseků - ETAPA 1

termín: 14.5.2018 - 4.6.2018 - provoz po stávajícím asfaltu (vyfrézované kraje 1m)
4.6.2018 - 17.6.2018 - celoplošné frézování, pokládka ložných vrstev

- v pracovní dobu bude provoz řízen pracovníky provádějící organizace


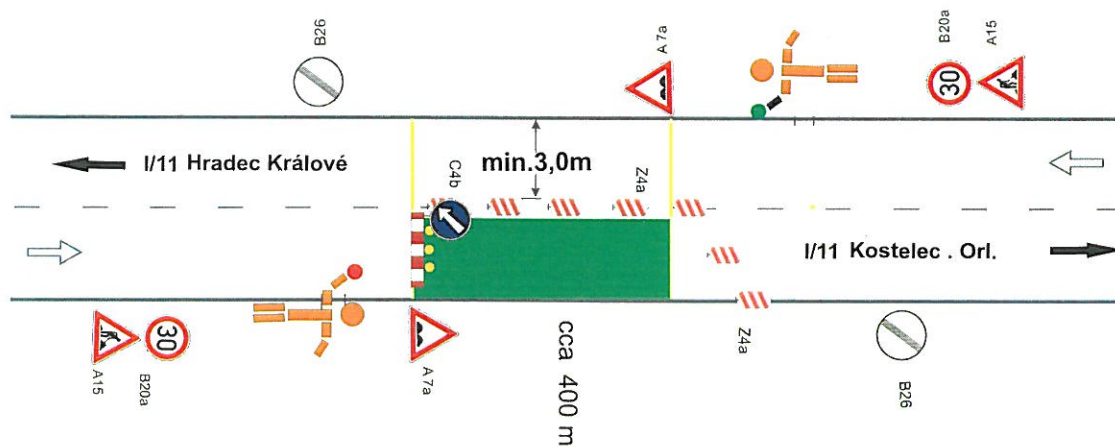


- mimo pracovní dobu bude provoz řízen světelnou signalizací

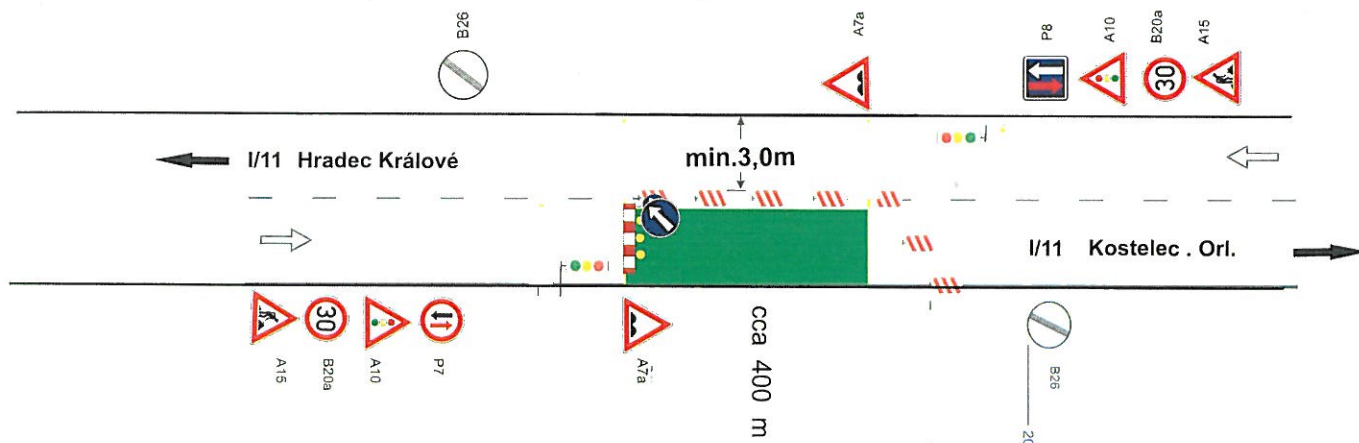


I/11 - Častolovice - oprava silnice - dle jednotlivých úseků - ETAPA 1 a 2

termín: 4.8.2018 - 5.8.2018 - pokládka obrusné vrstvy po polovinách

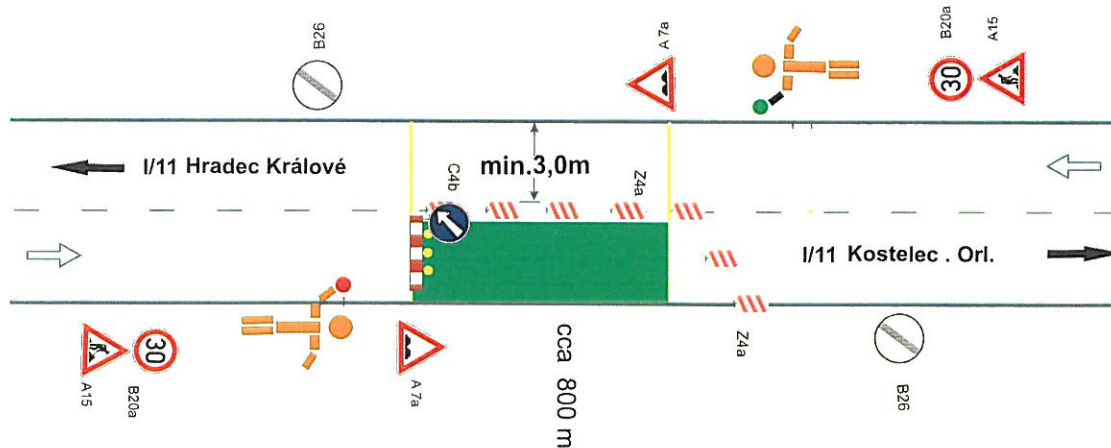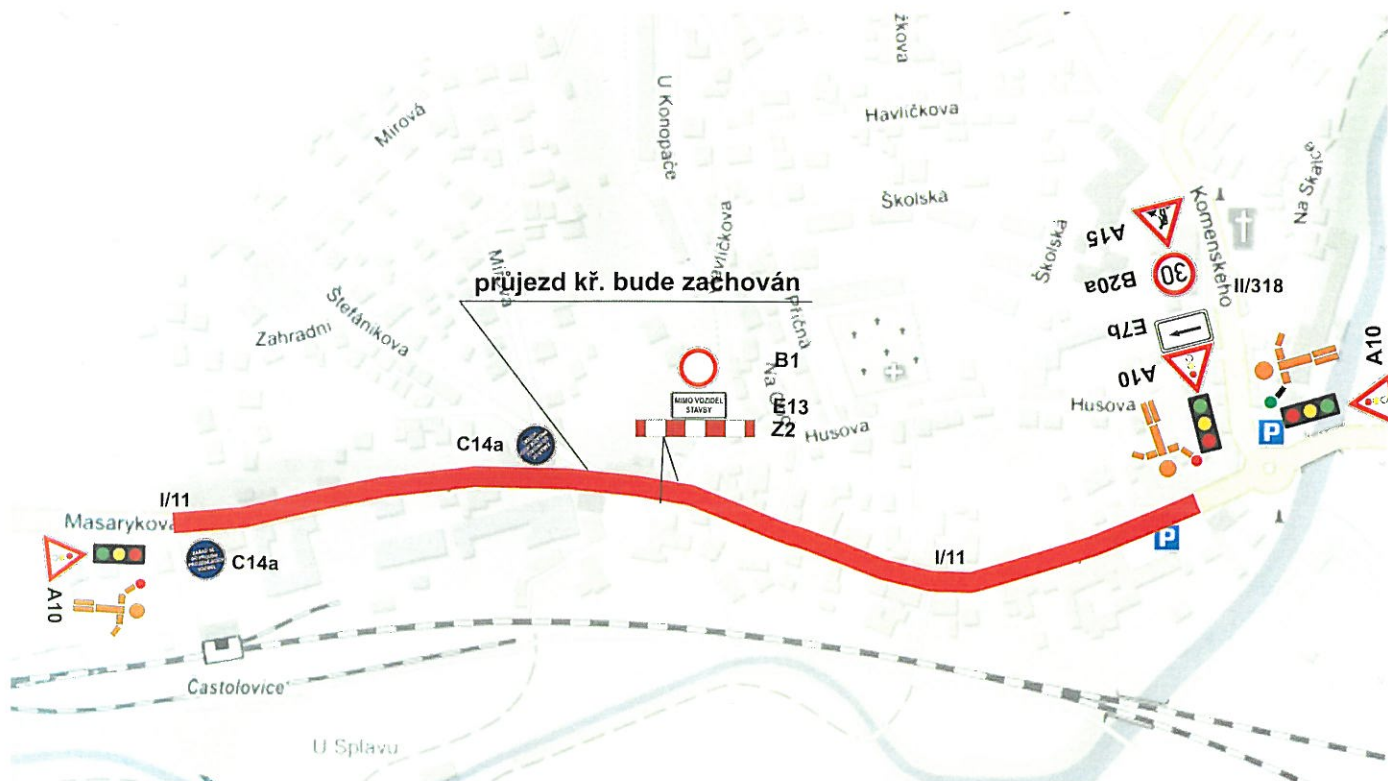



- mimo pracovní dobu bude provoz řízen světelnou signalizací

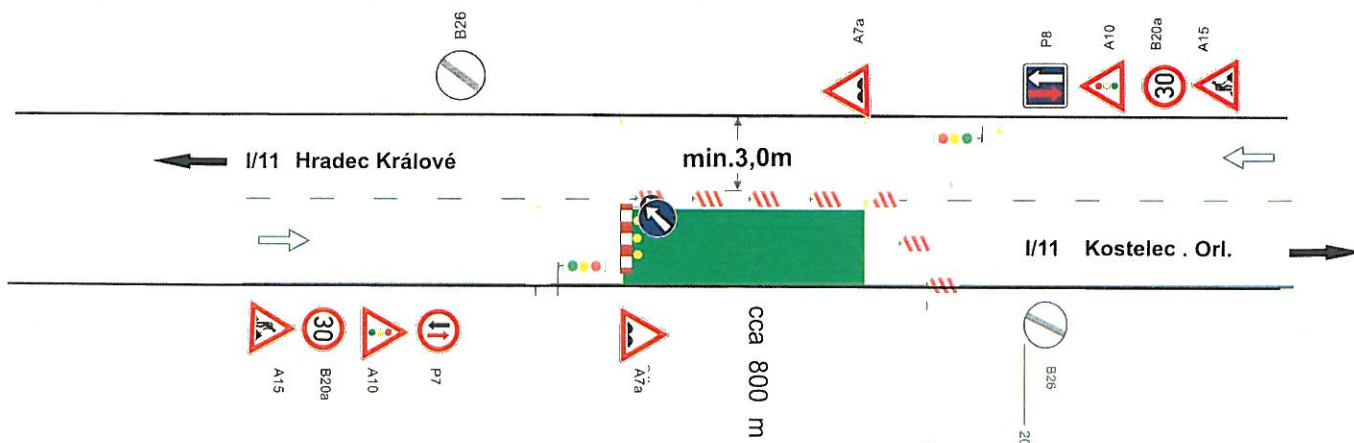


I/11 - Častolovice - oprava silnice - dle jednotlivých úseků - ETAPA 2

termín: 18.6.2018 - 22.7.2018 - provoz po stávajícím asfaltu (vyfrézované kraje 1m)
23.7.2018 - 3.8.2018 - celoplošné frézování, pokládka ložných vrstev

- v pracovní dobu bude provoz řízen pracovníky provádějící organizace

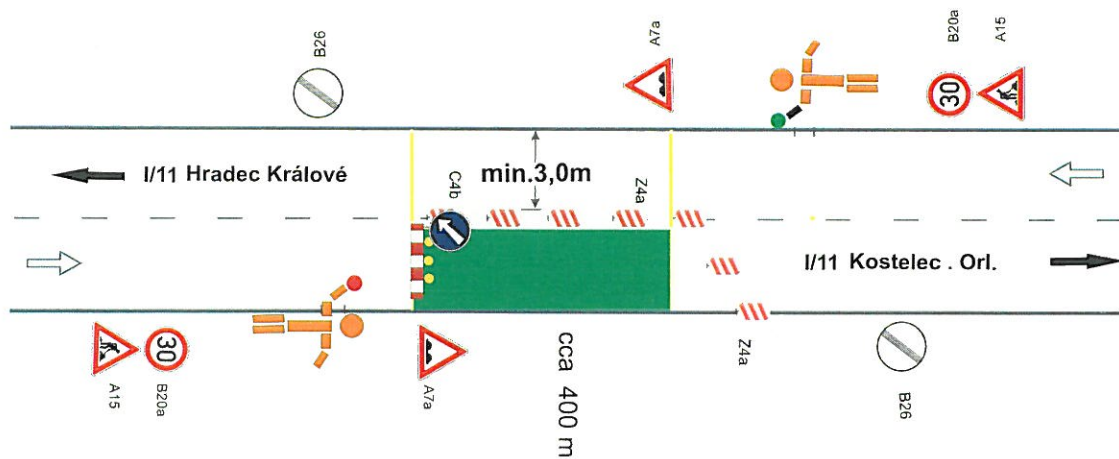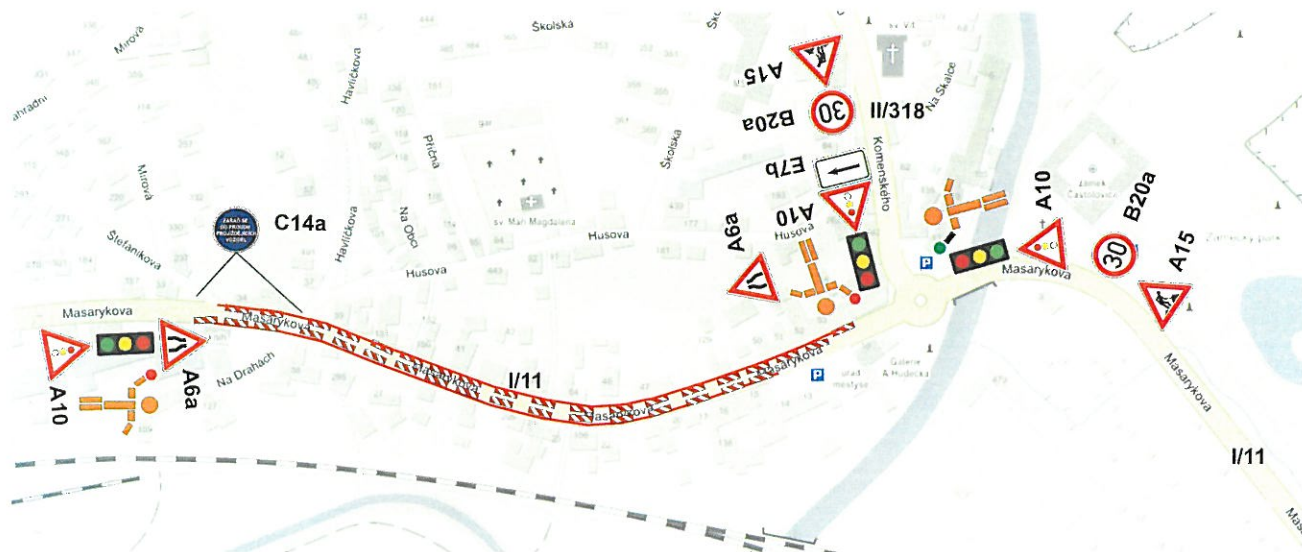

- mimo pracovní dobu bude provoz řízen světelnou signalizací


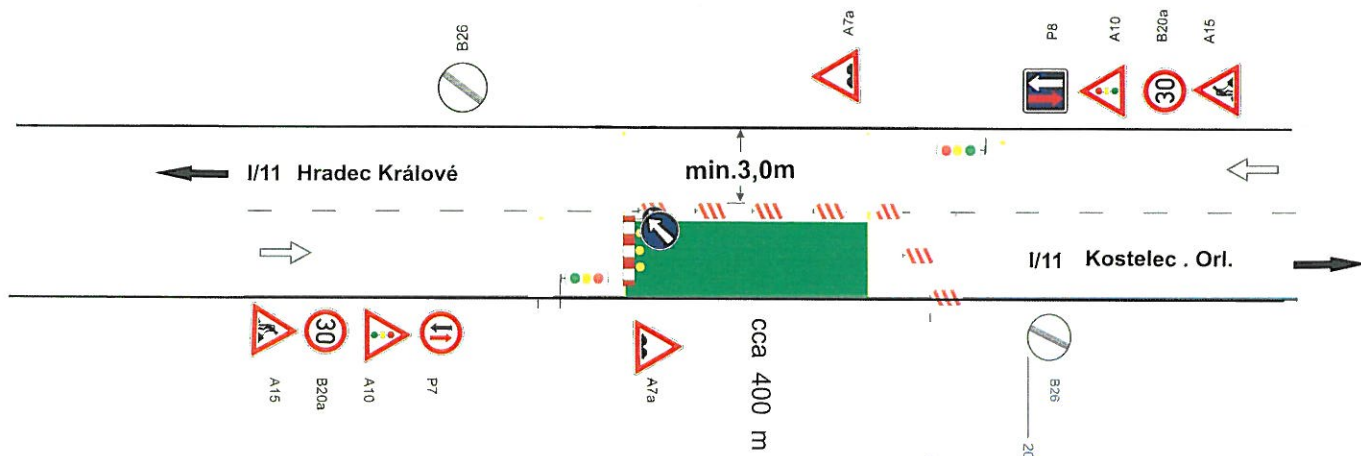


I/11 - Častolovice - oprava silnice - dle jednotlivých úseků - ETAPA 3


termín: 6.8.2018 - 31.8.2018 - frézování a pokládka podkladních vrstev po polovinách

1.9.2018 - 2.9.2018 - pokládka obrusné vrstvy v celé délce 800 m

- v pracovní dobu bude provoz řízen pracovníky provádějící organizace

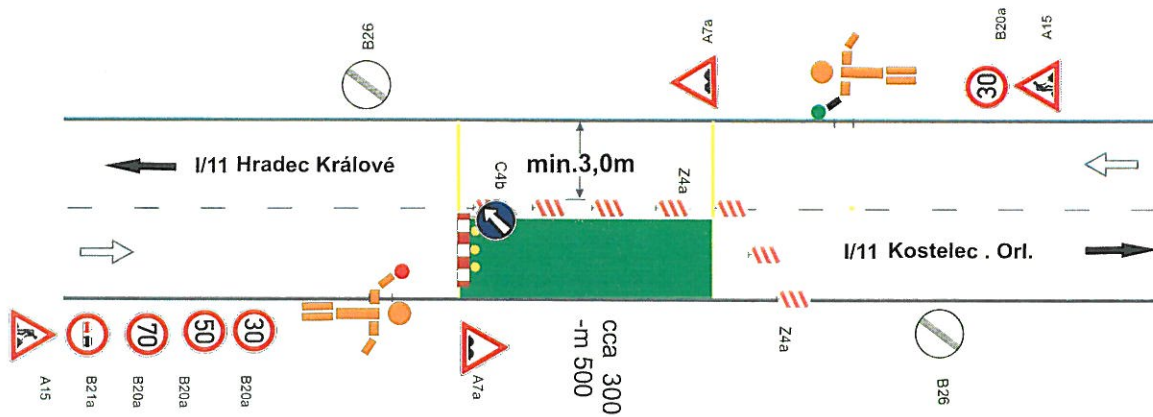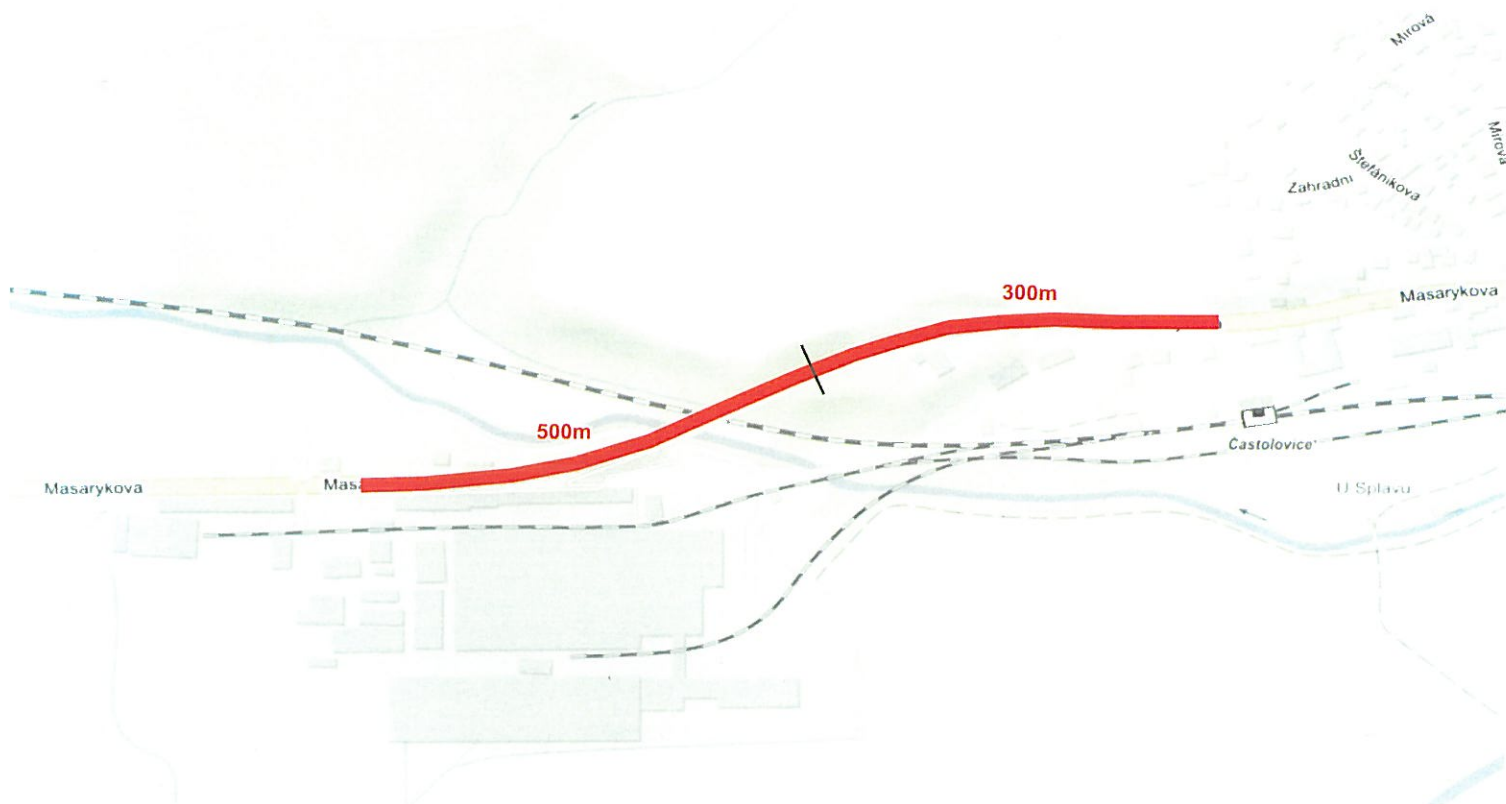


- mimo pracovní dobu bude provoz řízen světelnou signalizací

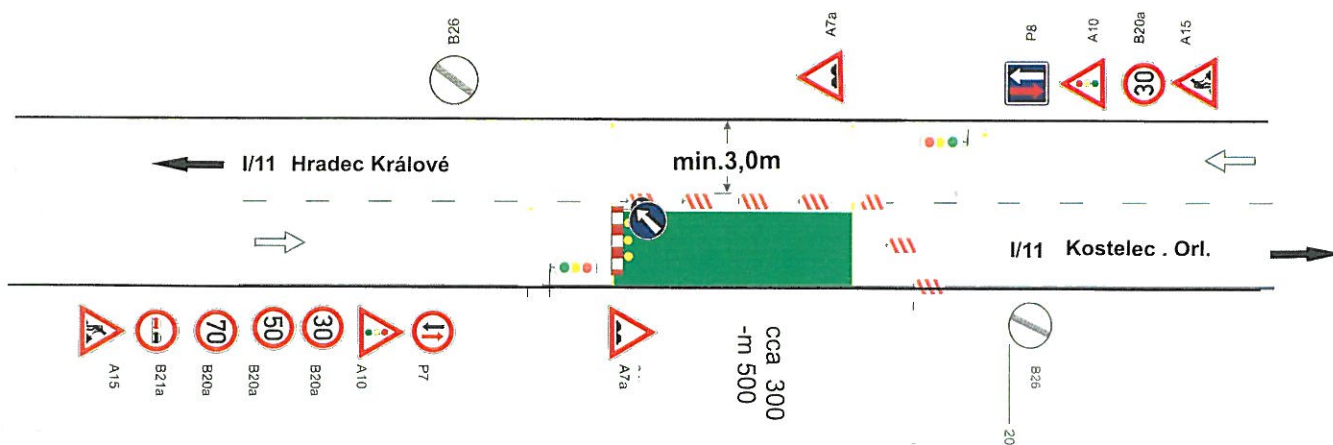


9.7.2018 - 29.7.2018

- oprava řims na mostě a odbočka k nádraží - rozšíření

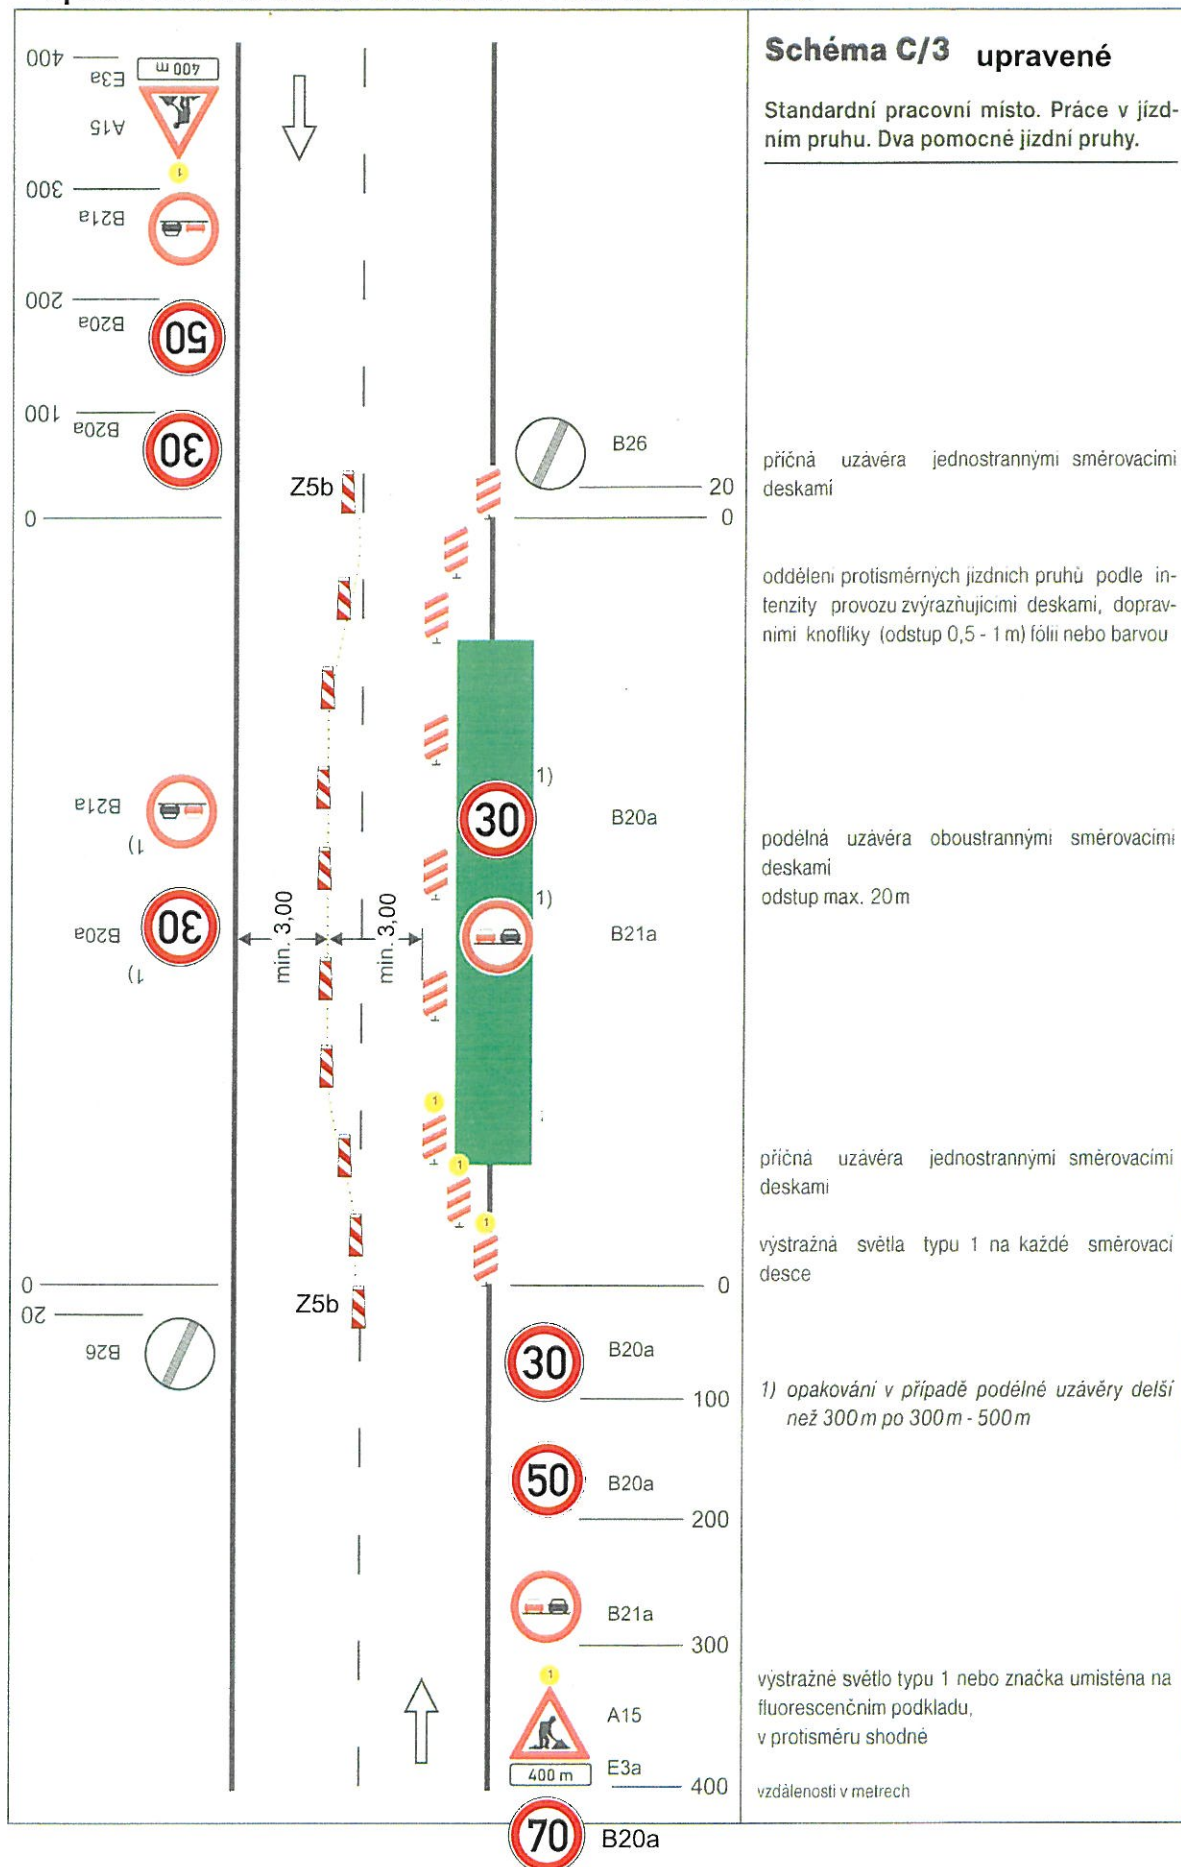

I/11 Častolovice - oprava silnice
termín : 14.5.2018 - 2.9.2018

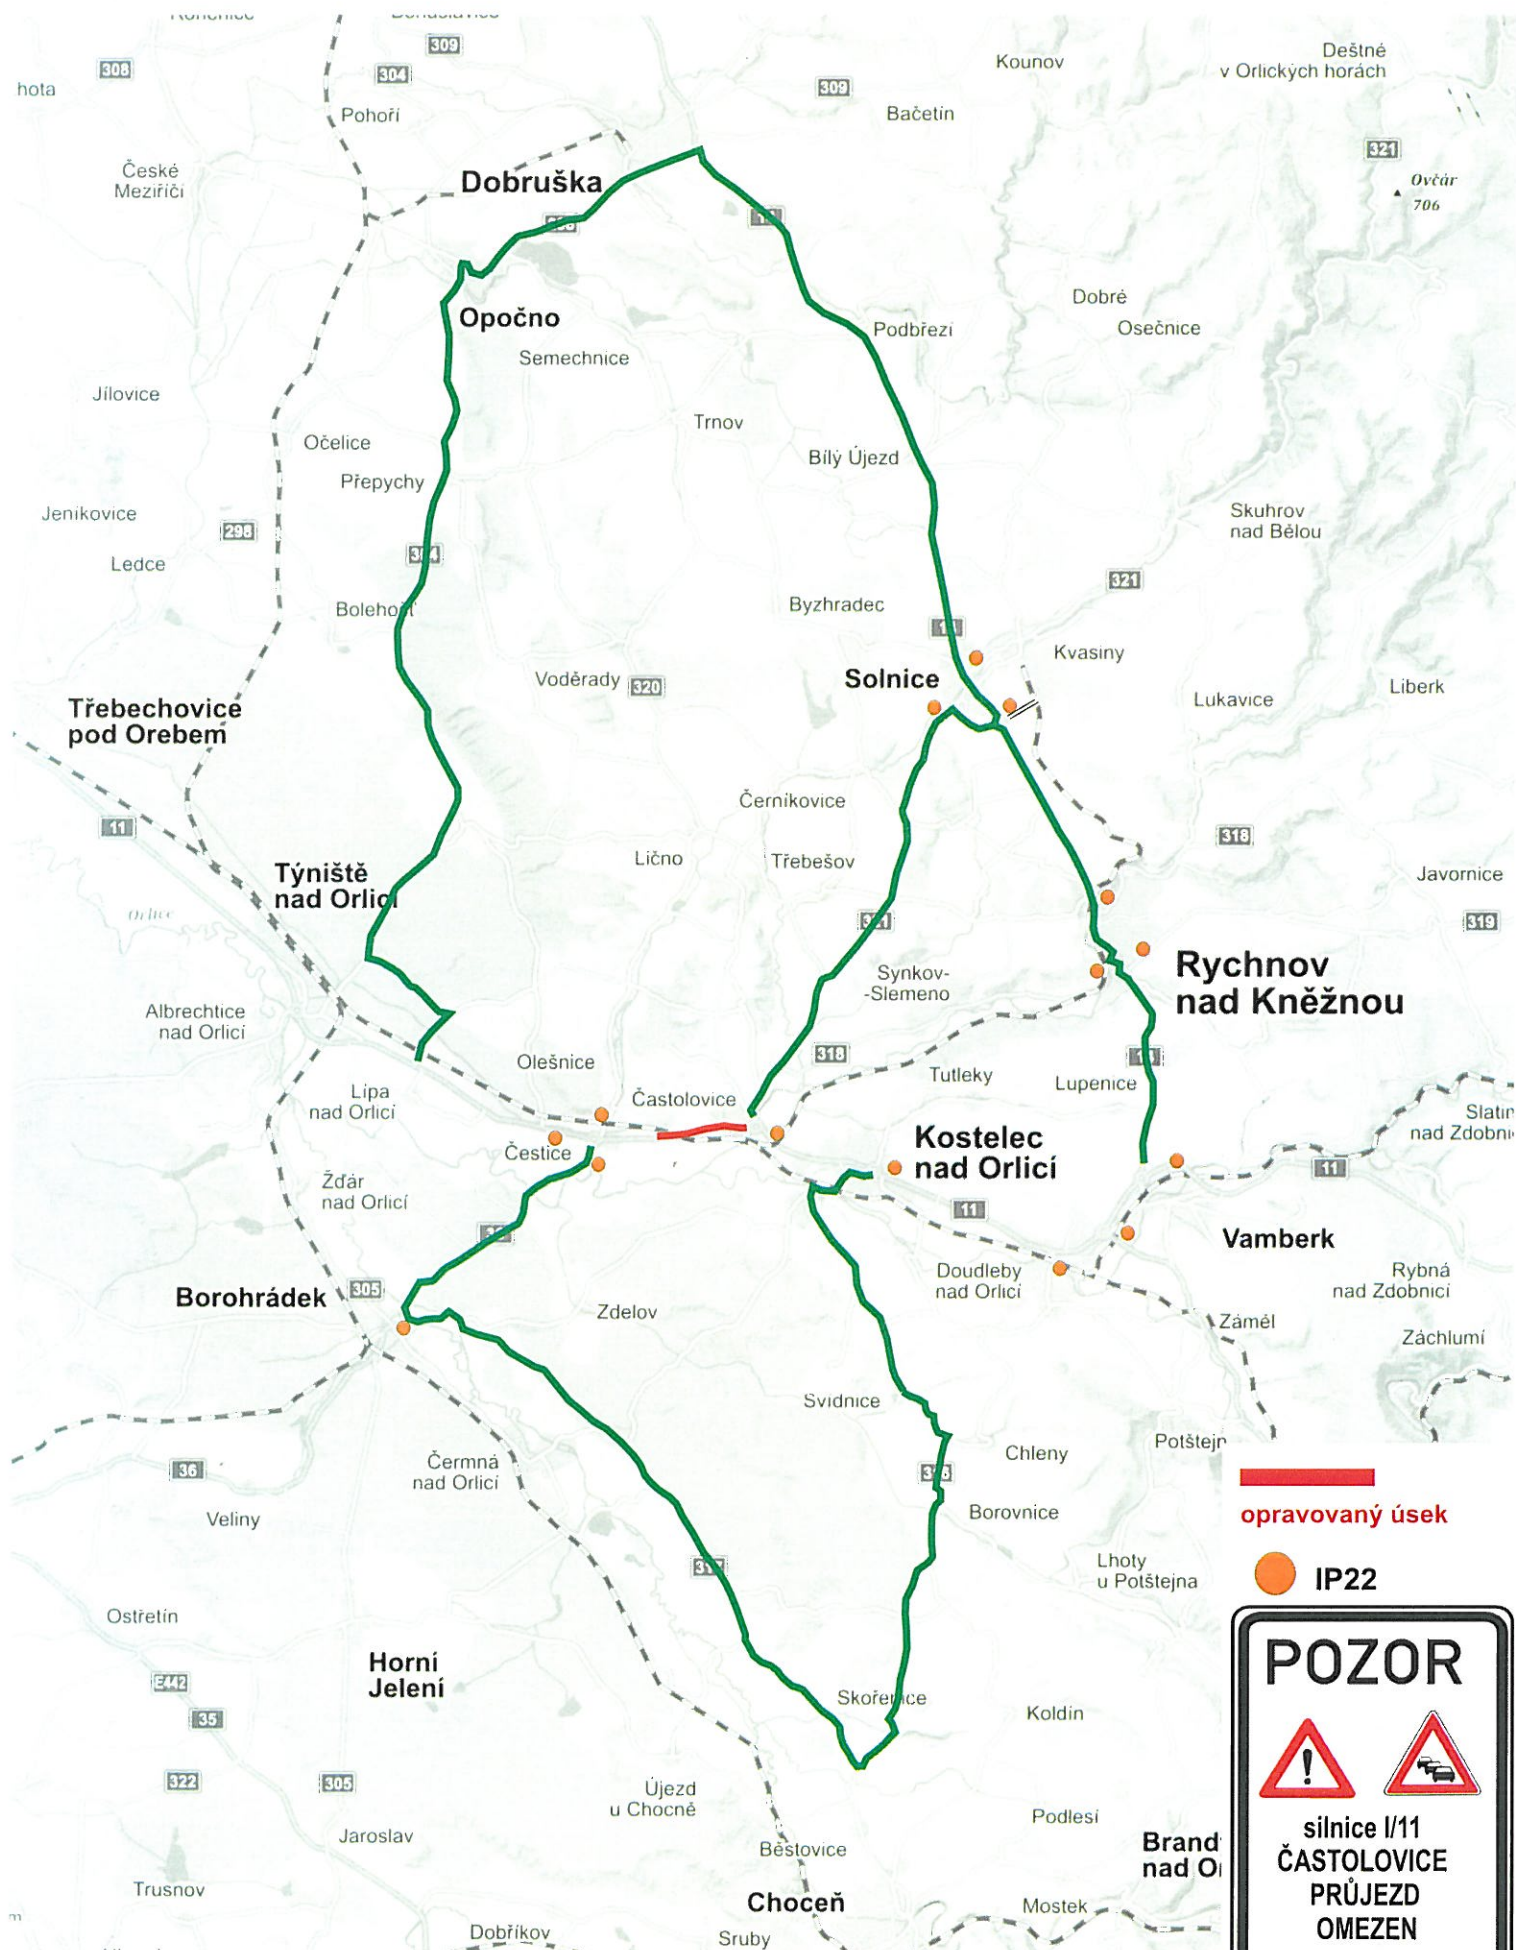

I/11 Častolovice - 3x překop komunikace pro vodovod za úplné uzavírky - objízdná trasa
termín : **20.5.2018**

